| Id | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | **Diseño, Construcción e implementación de sistema de clasificación de proveedores** | **268 días** | **mié 2/10/10** | **jue 11/25/10** | |
| 2 | | **Gestión del Proyecto** | **27 días** | **mié 2/10/10** | **mié 3/10/10** | |
| 3 | | Designación de responsabilidade | 7 días | mié 2/10/10 | mié 2/17/10 | |
| 4 | | Especificación del alcance | 20 días | mié 2/17/10 | mié 3/10/10 | 3 |
| 5 | | Identificación de interesados | 4 días | mié 2/17/10 | dom 2/21/10 | 3 |
| 6 | | **Decisión de hacer o adquirir** | **10 días** | **lun 2/22/10** | **jue 3/4/10** | |
| 7 | | Trabajos a ser realizados por el equipo del proyecto | 10 días | lun 2/22/10 | jue 3/4/10 | 5 |
| 8 | | Trabajos a ser realizados por empresa certificadora | 10 días | lun 2/22/10 | jue 3/4/10 | 5 |
| 9 | | **Selección de empresa certificador** | **43 días** | **jue 3/4/10** | **lun 4/19/10** | |
| 10 | | Identificación de potenciales postores | 7 días | jue 3/4/10 | jue 3/11/10 | 7,8 |
| 11 | | Elaboración de bases | 10 días | vie 3/12/10 | lun 3/22/10 | 10 |
| 12 | | Realización de concurso | 26 días | mar 3/23/10 | lun 4/19/10 | 11 |
| 13 | | **Elaboración del procedimiento de clasificación de proveedores** | **38 días** | **mar 4/20/10** | **dom 5/30/10** | |
| 14 | | Reunión con interesados | 14 días | mar 4/20/10 | mar 5/4/10 | 12 |
| 15 | | Determinación de temas a evalu | 18 días | mié 4/28/10 | lun 5/17/10 | 14CC+8 días |
| 16 | | Definición de forma de evaluaci | 12 días | mar 5/18/10 | dom 5/30/10 | 15 |
| 17 | | **Plan de comunicaciones** | **21 días** | **lun 5/31/10** | **mar 6/22/10** | |
| 18 | | Identificación de proveedores | 7 días | lun 5/31/10 | lun 6/7/10 | 16 |
| 19 | | Elaboración de campaña de difusión | 14 días | lun 6/7/10 | mar 6/22/10 | 18 |
| 20 | | **Clasificación de proveedores** | **162 días** | **lun 5/31/10** | **sáb 11/20/10** | |
| 21 | | Análisis del universo de proveedores | 12 días | lun 5/31/10 | sáb 6/12/10 | 16 |
| 22 | | Ejecución de proceso de clasificación de proveedores | 150 días | sáb 6/12/10 | sáb 11/20/10 | 21 |
| 23 | | **Seguimiento y Control** | **145 días** | **mar 6/22/10** | **jue 11/25/10** | |
| 24 | | Elaboración de agenda de reuniones | 7 días | mar 6/22/10 | mar 6/29/10 | 19 |
| 25 | | Herramientas de control | 14 días | mié 6/30/10 | mié 7/14/10 | 24 |
| 26 | | Revisión de resultados finales | 4 días | dom 11/21/10 | jue 11/25/10 | 22 |

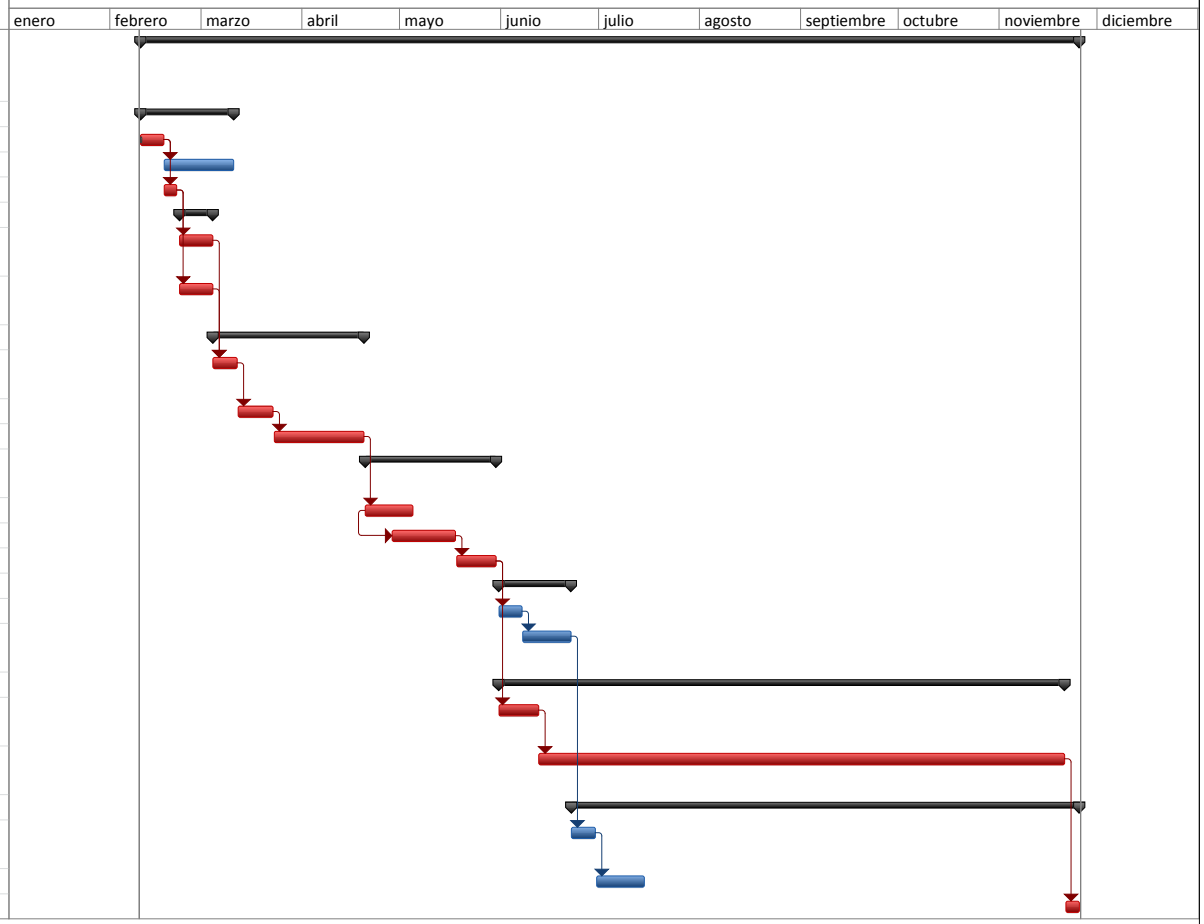


Proyecto: CRONOGRAMA DEL PRO
Fecha: jue 7/5/12

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarea | | Resumen del proyecto | | Hito inactivo | | Informe de resumen manual | | Fecha límite | |
| División | | Tareas externas | | Resumen inactivo | | Resumen manual | | Tareas críticas | |
| Hito | | Hito externo | | Tarea manual | | Sólo el comienzo | | División crítica | |
| Resumen | | Tarea inactiva | | Sólo duración | | Sólo fin | | Progreso | |
